


**Aperi IDVT - Phase 3**


Week Ending	02/02/07	02/09/07	02/16/07	02/23/07	03/02/07	03/09/07	03/16/07	03/23/07	03/30/07	04/06/07	04/13/07	04/20/07	04/27/07	05/04/07	05/11/07
Planned Exposed	25	50	50	50	75	100	125	150	150	175	175	195	195	205	205
Planned Successful	24	48	48	48	70	92	116	140	140	164	164	180	180	195	195
Actual Exposed	22	45	45	45	84	102	125	154	154	171	171	171	171	0	0
Actual Successful	21	43	43	43	78	96	118	145	145	167	167	169	169	0	0
Blocked	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan % Exposed	13%	25%	25%	25%	38%	49%	61%	73%	73%	86%	86%	100%	100%	100%	100%
Plan % Success	12%	24%	24%	24%	35%	45%	56%	68%	68%	80%	80%	92%	92%	95%	95%
Actual % Exposed	11%	23%	23%	23%	42%	50%	61%	75%	75%	84%	84%	84%	84%	0%	0%
Actual % Success	11%	22%	22%	22%	39%	47%	57%	70%	70%	81%	81%	82%	82%	0%	0%
% Blocked	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

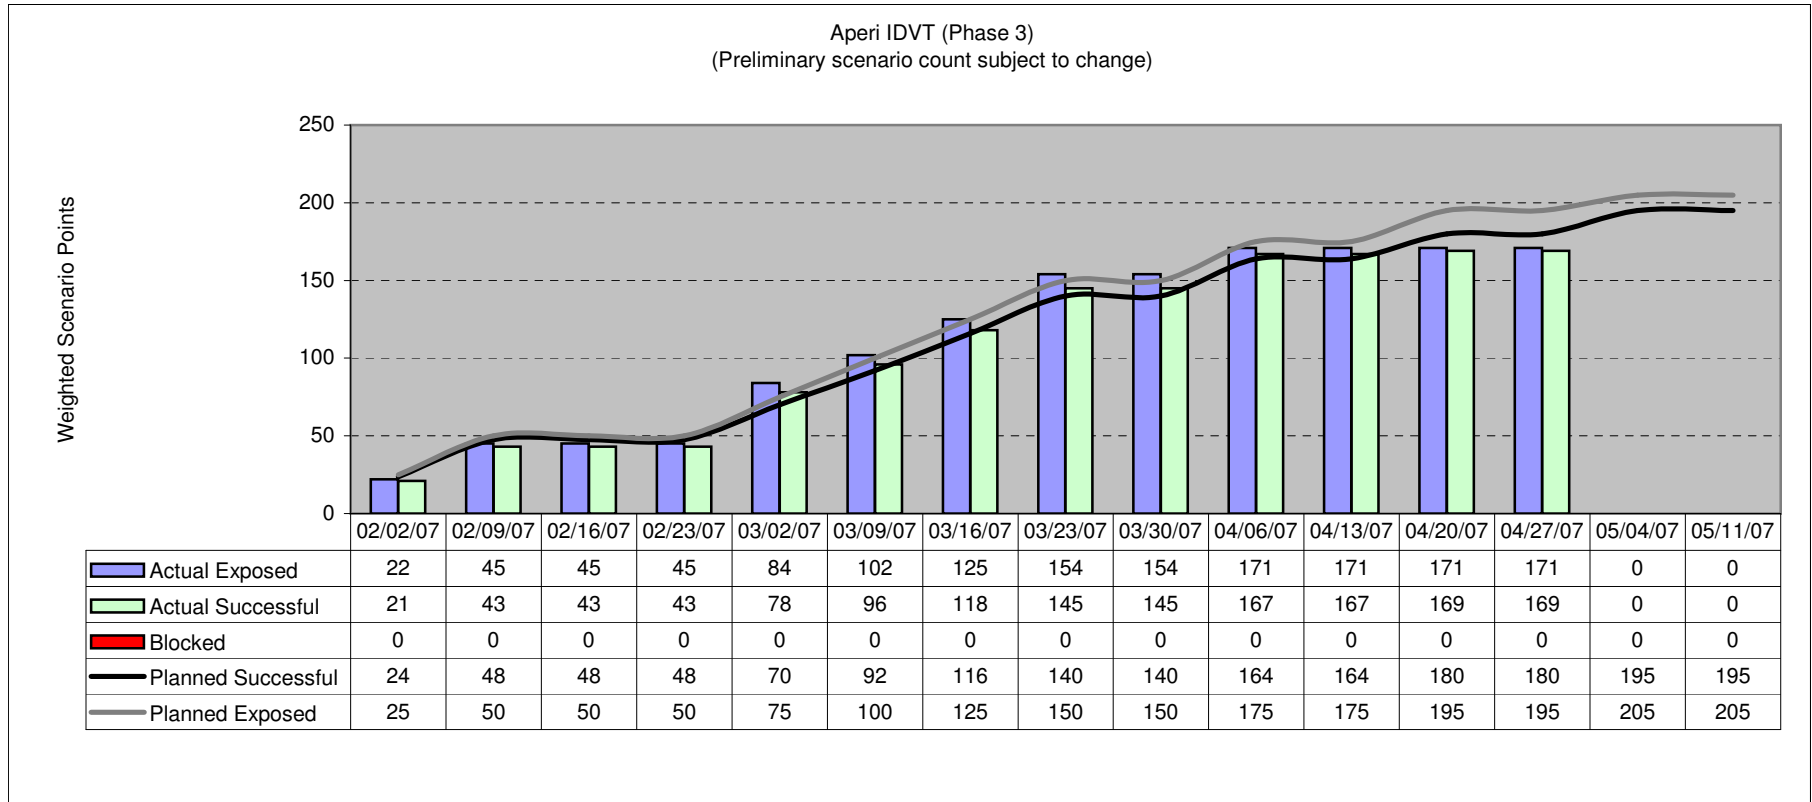

<b>Aperi IDVT, Phase 3 Defect Discovery Week Ending</b>	02/02/07	02/09/07	02/16/07	02/23/07	03/02/07	03/09/07	03/16/07	03/23/07	03/30/07	04/06/07	04/13/07	04/20/07	04/27/07	05/04/07	05/11/07
IDVT Estimate															
New (open)	29	29	29	29	31	27	28	16	12	15	14	13	15	0	0
Assigned (working)	3	3	3	3	3	2	3	3	8	7	8	7	7	0	0
Resolved (verified)	0	0	0	0	4	5	0	14	1	0	1	7	2	0	0
Verified (closed)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reopened	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0
Invalid	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Canceled	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (N.I. can/inv)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Aperi IDVT (Phase 3) Defect Discovery  
(Cancel/Return not in total)

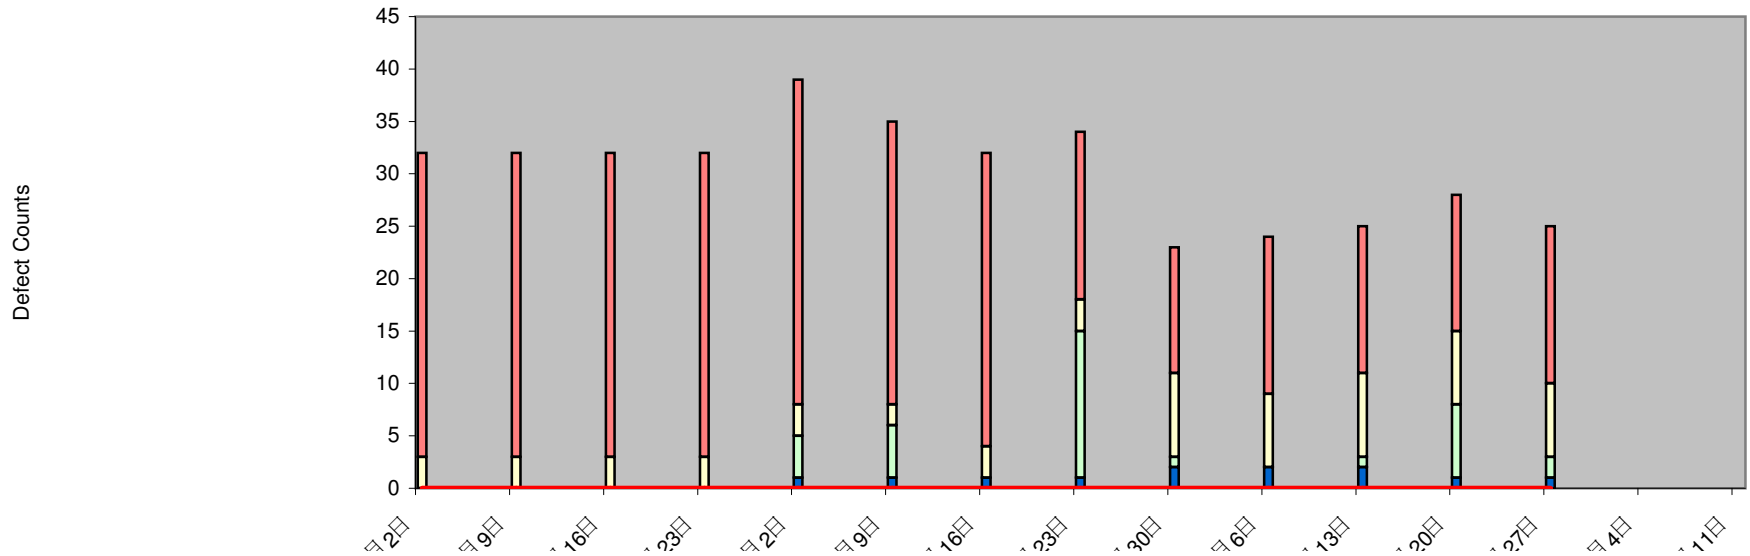

	2007年2月2日	2007年2月9日	2007年2月16日	2007年2月23日	2007年3月2日	2007年3月9日	2007年3月16日	2007年3月23日	2007年3月30日	2007年4月6日	2007年4月13日	2007年4月20日	2007年4月27日	2007年5月4日	2007年5月11日
	02/02/0 7	02/09/0 7	02/16/0 7	02/23/0 7	03/02/0 7	03/09/0 7	03/16/0 7	03/23/0 7	03/30/0 7	04/06/0 7	04/13/0 7	04/20/0 7	04/27/0 7	05/04/0 7	05/11/0 7
New (open)	29	29	29	29	31	27	28	16	12	15	14	13	15	0	0
Assigned (working)	3	3	3	3	3	2	3	3	8	7	8	7	7	0	0
Resolved (verified)	0	0	0	0	4	5	0	14	1	0	1	7	2	0	0
Reopened	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0
Canceled	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IDVT Estimate															

Defect Inventory: Sev 1,2	02/02/07	02/09/07	02/16/07	02/23/07	03/02/07	03/09/07	03/16/07	03/23/07	03/30/07	04/06/07	04/13/07	04/20/07	04/27/07	05/04/07	05/11/07
New (open)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0
Assigned (working)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0

Aperi (Phase 3) IDVT Defect Inventory  
Severity 1 (blk,cri) and 2 (maj)  
Open/Working States




	2006年11月10日	2006年11月13日	2006年11月16日	2006年11月19日	2006年11月22日	2006年11月25日	2006年11月28日	2006年12月1日	2006年12月4日	2006年12月7日	2006年12月10日	2006年12月13日	2006年12月16日	2006年12月19日	2006年12月22日
	02/02/07	02/09/07	02/16/07	02/23/07	03/02/07	03/09/07	03/16/07	03/23/07	03/30/07	04/06/07	04/13/07	04/20/07	04/27/07	05/04/07	05/11/07
■ New (open)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0
■ Assigned (working)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0

**Defect Discovery**

<u>Defects</u>	<u>Severity</u>	<u>Description</u>
0	1	<i>Blocker, Critical</i>
5	2	<i>Major</i>
12	3	<i>Normal</i>
6	4	<i>r, Trivial, Enhance</i>

Aperi IDVT (Phase 3)  
 IDVT Defect Discovery By Severity  
 (Not including canceled and invalid)

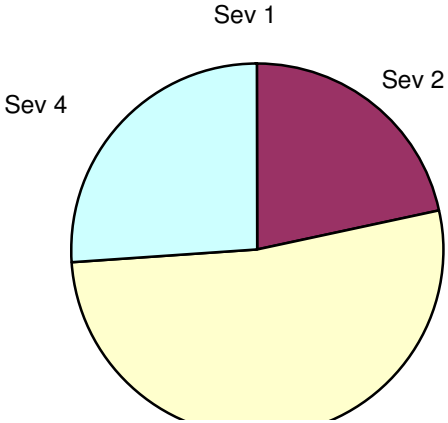



Sev 3

1

」

」

]





